



## 16 • Pembangunan Kampus



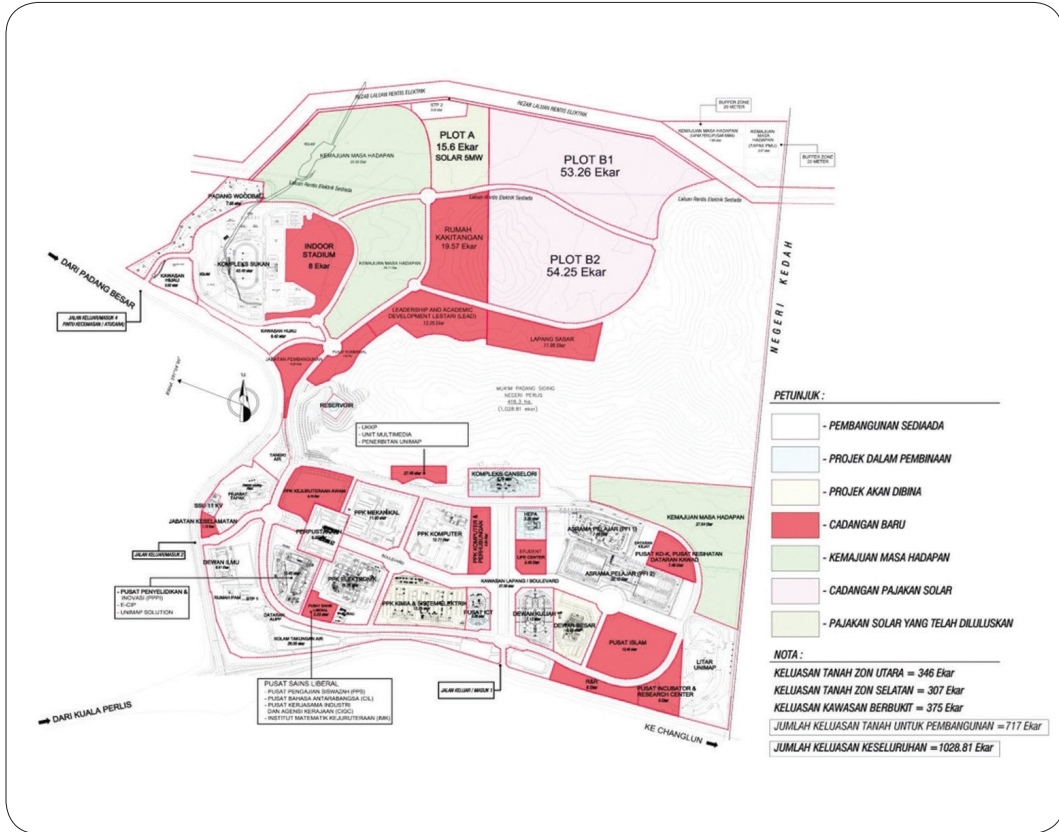

**Cadangan Pelan Induk Kampus Alam Pauh Putra**

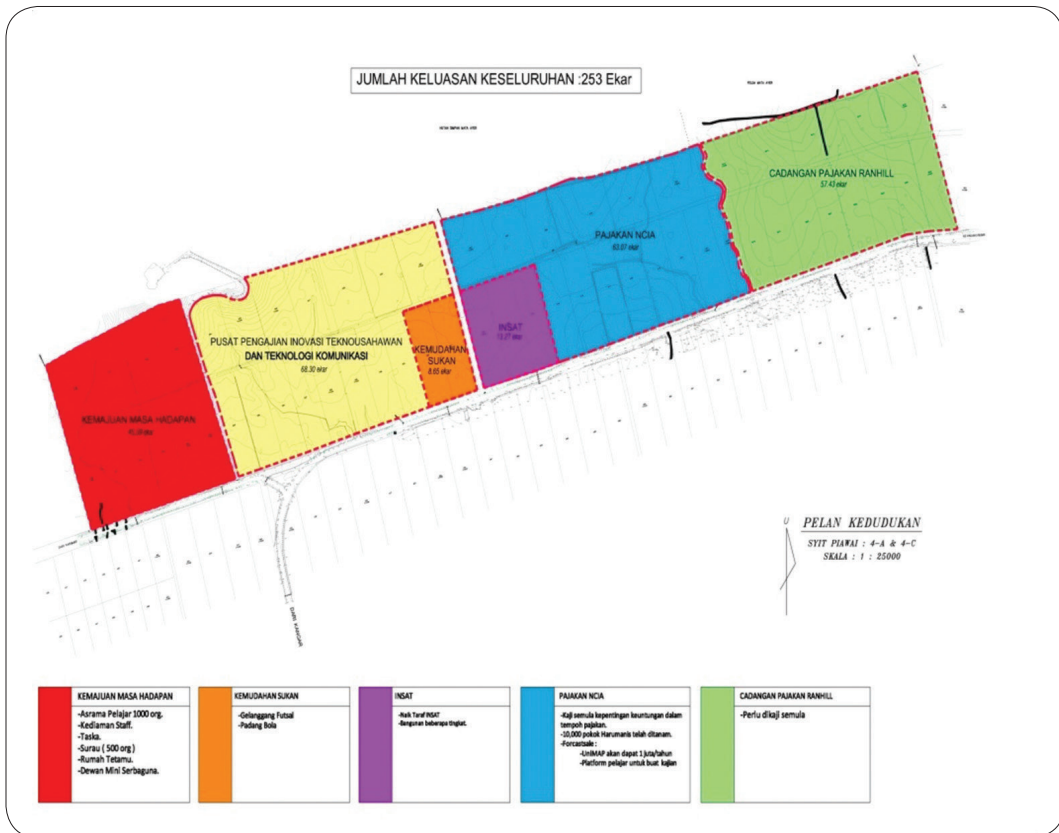

**Cadangan Pelan Kampus Sungai Chuchoh**

## 16.1 PEMBANGUNAN KAMPUS ALAM PAUH PUTRA RANCANGAN MALAYSIA KE SEBELAS (RMKe-11) (PROJEK SAMBUNGAN)

### Senarai Projek Pada Tahun 2019

Bil.	Senarai Projek	Kos Projek	Agensi Pelaksana	Status
1.	Bangunan Canselori / Pendaftar & Bendahari	53 Juta	JKR	Dalam Pembinaan (98.4% Siap)
2.	Pusat Pengajian Kejuruteraan Bahan	106 Juta	JKR	Dalam Pembinaan (25% Siap)
3.	Pusat Pengajian Kejuruteraan Sistem Elektrik			
4.	Dewan Besar	29 Juta	JKR	Dalam Pembinaan (60% Siap)
5.	Pusat Islam / Masjid	34.8 Juta	JKR	Rekabentuk
6.	Pusat Kesihatan Universiti	12.3 Juta	JKR	Rekabentuk

#### DALAM PEMBINAAN



PROJEK	KONTRAKTOR	KEMAJUAN FIZIKAL
Bangunan Pentadbiran Canselori	RNEM Engineering Sdn Bhd	100,00% (Jadual) 98.40% (Sebenar)
	<b>KOS PROJEK</b>	
	RM 53 Juta	

**DALAM PEMBINAAN**



PROJEK	KONTRAKTOR	KEMAJUAN FIZIKAL
Bangunan PPK Bahan dan PPK Sistem Elektrik	Akas Engineering & Trading Sdn Bhd	65.00% (Jadual) 25.00% (Sebenar)
	<b>KOS PROJEK</b>	
	RM 106 JUTA	

**DALAM PEMBINAAN**



PROJEK	KONTRAKTOR	KEMAJUAN FIZIKAL
Bangunan Dewan Besa	Amnaconstruction Sdn Bhd	81.00% (Jadual) 60.00% (Sebenar)
	<b>KOS PROJEK</b>	
	RM 29 JUTA	

PRA PEMBINAAN



PROJEK	AGENSI PELAKSANA	STATUS SEMASA
Bangunan Pusat Islam / Masjid	JKR	Peringkat Rekabentuk
	KOS PROJEK	
	RM 34.8 JUTA	

PRA PEMBINAAN



PROJEK	AGENSI PELAKSANA	STATUS SEMASA
Bangunan Pusat Kesihatan Universiti	JKR	Peringkat Rekabentuk
	KOS PROJEK	
	RM 12.3 JUTA	

## PROJEK-PROJEK BAHARU RMKe 11 Rolling Plan 4 (RP4 2020)

Pihak UniMAP telah mengemukakan 6 permohonan projek baharu di dalam Rancangan Malaysia Ke Sebelas Rolling Plan 4 (RMKe-11 RP4) 2020. Senarai projek-projek baharu yang dikemukakan adalah :-

Bil.	Senarai Projek	Kos Projek (RM)
1.	Bangunan Pentadbiran Dewan Besar dan Setor Peralatan	25,000,000.00
2.	Kompleks Dewan Kuliah Kampus Sungai Chuchuh	30,000,000.00
3.	Menaiktaraf Infrastruktur Kampus Alam Pauh Putra (Zon Selatan)	15,000,000.00
4.	Kompleks Pusat Akademik	30,000,000.00
5.	Bangunan Jabatan Pembangunan Fasiliti dan Harta	15,000,000.00
6.	Bangunan Jabatan Keselamatan	10,000,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>125,000,000.00</b>

Namun begitu, pihak Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA) tidak meluluskan 6 permohonan projek baharu UniMAP untuk dilaksanakan pada tahun 2020.

### KESIMPULAN

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Harta (JPPH) sentiasa komited dalam memastikan semua projek pembangunan dapat dilaksanakan mengikut perancangan bagi memastikan prasarana dan kemudahan akademik dapat disediakan mengikut keperluan pelanggan.

Dalam pada itu, inisiatif dan usaha dari semua pihak telah banyak membantu dalam memastikan prestasi peraksanaan projek pembangunan dapat ditingkatkan dari masa ke semasa.
